Projekt magazin

Schnelleinstieg Projektmanagement

Das erste Projekt erfolgreich meistern
Teil 2: Rollende Planung und Staffellaufprinzip

von Dr. Georg Angermeier

Das Projekt ist in groben Zügen geplant. Die Arbeitspakete stehen fest und sind in einem Ablaufschema sortiert. Um schnell voranzukommen, wird die Termin- und Ressourcenplanung projektbegleitend durchgeführt. Dies setzt Flexibilität, Disziplin und ein erhebliches Maß an Kreativität voraus. Mit weiteren Vereinfachungen traditioneller Methoden und klaren Regeln kann man auch in dieser herausfordernden Situation das Projekt auf Zielkurs halten.

Dr. Georg Angermeier

Dipl.-Physiker, PM-Berater, Mitglied GPM, PMI, VDI-GSP, Mitarbeit im DIN-Ausschuss NQSZ-4.

Kontakt:
Georg_Angermeier@Ask-ASC.de

Mehr Informationen unter:
www.projektmagazin.de/autoren/

Was Sie beachten sollten

Das Ziel bestimmt den Weg

Während die im ersten Teil der Artikelserie behandelte Planung noch sehr allgemeingültig beschrieben werden konnte, treten bei der anschließenden Projektdurchführung die Unterschiede zwischen Branchen, Unternehmen und Personen deutlicher zu Tage. Beispielsweise ist bei dem einen Projekt der Endtermin das absolut wichtigste, dagegen steht bei einem anderen Projekt die exakte Erfüllung aller Anforderungen im Vordergrund. In dem einen Unternehmen sind Positionen und Titel nebensächlich, aber in einem anderen Unternehmen bestimmen sie die Geschäftsprozesse weitgehend.

Die im folgenden dargestellten Methoden dürfen Sie daher nicht als unveränderliche Formvorschriften ansehen. Vielmehr sollten Sie sie als Vorschlag zur eigenen Projektgestaltung verwenden. Wenn die Unternehmenskultur es z.B. nicht ermöglicht, ein Kick-off-Meeting durchzuführen, können Sie als Alternative versuchen, alle Projektbeteiligten in der Kantine zum gemeinsamen Mittagessen zusammenzubringen.

Ein charakteristisches Merkmal von Projektarbeit ist zudem, dass Sie immer wieder mit ungeplanten und unvorhersehbaren Situationen konfrontiert sind. Dies gilt vor allem bei dem beschriebenen Schnelleinstieg in ein spontanes Projekt, da hier auf eine detaillierte Ablaufplanung verzichtet wurde.

Zur Bewältigung von Hindernissen auf dem ursprünglich geplanten Weg gibt es zwei Grundprinzipien, die Sie sich immer wieder bewusst machen sollten:

1. Fokussierung auf das ursprüngliche Ziel
2. Flexibilität für den Weg dorthin

Der beliebte Spruch "Der Weg ist das Ziel" gilt nicht im Projektmanagement. Dort ist es genau umgekehrt. Es kommt ausschließlich darauf an, das mit dem Auftraggeber vereinbarte Ergebnis zu erzielen. Im ersten Teil der Artikelfolge wurde deshalb besonderer Wert auf eine belastbare und überprüfte Zielbeschreibung gelegt, die Ablaufplanung hingegen wurde grob vereinfacht.

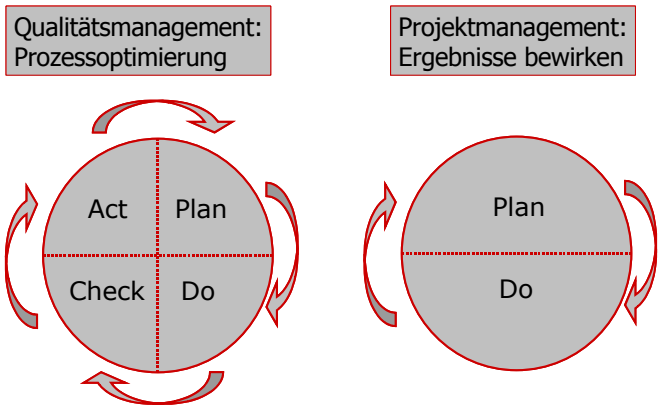

Bild 1: Reduzierung des PDCA-Zyklus für vereinfachtes Projektmanagement.

Dieser Artikel kann nicht alle Eventualitäten eines Projektablaufs beschreiben. Deshalb müssen Sie selbst beständig das Projektumfeld überwachen und eigenverantwortlich entscheiden und umsetzten, was in der aktuellen Situation wichtig und richtig ist.

Persönliches Exemplar für Dr. Ingrid Giel, ingrid.giel@fhnw.ch. Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

© 2005 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

Planung und Projektarbeit trennen

Das "Kochrezept" für den Umgang mit Situationen, die sich dynamisch verändern, übernehmen wir vom Qualitätsmanagement – allerdings in reduzierter Form. Wir vereinfachen dazu den aus dem Total Quality Management stammenden Regelkreis "Plan", "Do", "Check", "Act" (Deming-Zyklus), der zur Überprüfung und Bewertung von Prozessabläufen und ihrer anschließenden Optimierung dient und aus den vier zyklisch zu durchlaufenden Schritten besteht:

1. Plan: Planen, was zu tun ist
2. Do: Den geplanten Prozess ausführen
3. Check: Ablauf und Ergebnis des Prozesses überprüfen und bewerten
4. Act: Steuerungsmaßnahmen ergreifen, um den durchgeführten Prozess zu verbessern

Die Vereinfachung für den Schnelleinstieg ins Projektmanagement besteht darin, die beiden für den kontinuierlichen Verbesserungsprozess im Qualitätsmanagement notwendigen Schritte "Check" und "Act" wegzulassen.

6. Vereinfachung: Reduzieren Sie den PDCA-Regelkreis auf die beiden Punkte Plan–Do.

Worauf wir verzichten, ist eine Reflexion und Verbesserung des Projektablaufs mit dem Ziel, es im nächsten Projekt besser machen zu können. Ihr aktuelles Projekt kann davon nicht mehr profitieren, deshalb konzentrieren Sie sich nur auf Ihre unmittelbare Aufgabe. Vereinfacht ausgedrückt: Denken Sie nicht über begangene Fehler nach, sondern suchen Sie immer nach Lösungsmöglichkeiten für den nächsten Schritt in Richtung Ziel!

Davon ungeachtet müssen Sie und alle Projektbeteiligten beständig die Arbeitsergebnisse (Vergleich mit der Zielbeschreibung!) überprüfen und nach Möglichkeiten suchen, das Projektziel letztendlich schneller oder kostengünstiger als geplant zu erreichen. Ebenso müssen Sie das Projekt abbrechen oder neu planen, wenn sich das ursprünglich gesetzte Ziel als nicht erreichbar erweist. Auf diese Sonderfälle wird der dritte und letzte Teil der Artikelfolge explizit eingehen.

Der wesentliche Nutzen von Plan-Do besteht in der klaren Trennung von Planung und Durchführung. Das klingt einfach, ist aber sehr schwer einzuhalten. Nur all zu leicht gleitet eine Planungsbesprechung in die Diskussion technischer Probleme ab. Auch umgekehrt ist die Versuchung groß, während der Bearbeitung von Projektaufgaben die Projektplanung in Frage zu stellen. Meist geschieht das aus Unsicherheit heraus: entweder aus Unsicherheit, ob die aktuelle Aufgabe sinnvoll zum Projektergebnis beiträgt oder aus Unsicherheit gegenüber der projektorientierten Arbeitsweise. Deshalb: Planen Sie nicht während Sie ausführen. Arbeiten Sie nicht zugleich am Projekt während Sie planen!

Einen ersten Eindruck von der Bedeutung des Qualitätsmanagements für das Projektmanagement gibt Ihnen der Tipp von Regina Wolf "Qualitätsmanagement – was nutzt es dem Projekt?", Ausgabe 04/05.

Der Startschuss

Mit folgenden Maßnahmen bzw. Vorgehensweisen sorgen Sie dafür, dass das Projekt an Fahrt gewinnt und sich nicht im Kreis dreht:

- Durchführung eines Kick-off-Meetings, bei dem Spielregeln für die Zusammenarbeit vereinbart werden.
- Staffellauf-Prinzip mit hoher Eigenverantwortung der Beteiligten
- Rollende Planung mit klaren Abgrenzungen zwischen Planungs- und Durchführungsphasen.
- Operative Projektsteuerung auf Arbeitspaketebene mit Aufgabenlisten

Das Projekt zum Laufen bringen

Sie haben den Projektauftrag und die Freigabe der Planung. Aber in den Arbeitspaketen stehen noch keine Anfangs- und Endtermine, zum Teil auch noch keine Verantwortlichkeiten. Ihre Aufgabe ist es jetzt, das Projekt zum Laufen zu bringen.

Persönliches Exemplar für Dr. Ingrid Giel, ingrid.giel@fhnw.ch. Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

© 2005 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

Als erstes kümmern Sie sich darum, dass die Arbeitspakete aus der ersten Spalte des Ablaufschemas beginnen können. Falls noch nicht geschehen, legen Sie für jedes dieser Arbeitspakete einen Verantwortlichen fest. Informieren Sie diese persönlich über den Projektbeginn und das ihnen übertragene Arbeitspaket.

Vereinbaren Sie mit jedem Arbeitspaketverantwortlichen, wann er mit der Arbeit beginnt und wann er sie voraussichtlich abschließt. Tragen Sie diese Termine in das Ablaufschema und die Planungstabelle ein. Es ist empfehlenswert, die erste konkrete Tätigkeit mit dem Arbeitspaketverantwortlichen zu besprechen. Ansonsten kann sich Ihr Ansprechpartner später damit entschuldigen, dass er nicht wusste, womit er anfangen hätte sollen.

Kündigen Sie bei den Kontakten zugleich das Kick-off-Meeting (s.u.) an, am besten sammeln Sie schon Terminvorschläge. Natürlich wäre es besser, die Projektdurchführung erst danach zu initiieren. Im Sinne des Projektmarketings (das im letzten Teil der Serie besprochen wird) ist es für spontane Kleinprojekte aber wichtig, dem Projektauftraggeber so schnell wie möglich den Arbeitsbeginn melden zu können. Außerdem wird es nicht einfach sein, alle Projektbeteiligten zu einem gemeinsamen Termin zusammen zu bringen. Die Zeit bis dahin sollte nicht ungenutzt verstreichen.

Mit den ersten vereinbarten Termindaten führen Sie jetzt die Terminplanung für die erste und zweite Spalte des Ablaufschemas durch. Die Arbeitspakete des Projektmanagements lassen wir für die Terminplanung außer Acht, da sie keinen eigenständigen Einfluss auf den Projektablauf haben. Bei anderen Projektarten kann die Projektplanung dagegen das Projektgeschehen im wesentlichen bestimmen, wie z.B. im Bauprojektmanagement.

7. Vereinfachung:
Für die Terminplanung werden nur die Arbeitspakete der Projektdurchführung betrachtet.

Aus dieser Vereinfachung ergibt sich nun auch der Termin für den offiziellen Projektstart: Der Projektstarttermin ist der Tag, an dem das früheste Arbeitspaket der Projektdurchführung beginnt. Diesen Termin verwenden Sie ab jetzt als Referenzzeitpunkt für alle Berechnungen, Berichte und Präsentationen.

Als letztes legen Sie die Starttermine für die Arbeitspakete aus der zweiten Spalte fest. Für jedes Arbeitspaket überprüfen Sie, von welchen Arbeitspaketen es abhängt. Starttermin ist der späteste Endtermin all seiner Vorgänger.

Kick-Off-Meeting durchführen

Die wichtigste Projektbesprechung ist das Kick-Off-Meeting. Als einzige Besprechungsform fällt sie daher nicht der radikalen Vereinfachung des Schnelleinstiegs zum Opfer. Das Kick-Off-Meeting sorgt dafür, dass alle Projektbeteiligten auf dem gleichen Informationsstand sind und dass alle den Beginn der Projektarbeiten bewusst wahrnehmen.

Wenn irgend möglich, holen Sie deshalb alle Projektbeteiligten zu einer kurzen Startbesprechung zusammen. Diese braucht nicht länger als eine Stunde dauern. Es ist nicht Ihr Ziel, das viel zitierte "eingeschworene Projektteam" zu schmieden. Diese Erwartungshaltung wäre unangemessen für ein Spontanprojekt. Das Kick-off-Meeting soll lediglich eine temporär bestehende Gruppe arbeitsfähig machen. Hierzu sind drei Inhalte wichtig:

- Vorstellung des Projektplans (mit Zielbeschreibung, Arbeitspaketen und Ablaufschema)
- Festlegen aller Arbeitspaketverantwortlichen
- Erläuterung und Vereinbarung der (nachfolgend beschriebenen) Spielregeln für die Projektdurchführung

Im Idealfall kommt der Auftraggeber zum Kick-Off-Meeting dazu und stellt das Projektziel vor. Leider ist es immer wieder anzutreffen, dass selbst das Kick-Off-Meeting von Vorgesetzten aus der Linie nicht gern gesehen bzw. missbilligt wird. In diesem Fall müssen Sie nach Alternativen suchen, wie z.B. die Umbenennung in einen "Spezifikations-Workshop" oder Möglichkeiten zum informellen Treffen.

Ausführlichere Informationen, wie Sie ein Kick-off-Meeting gestalten können, finden Sie im Artikel von Hedwig Kellner "Kick-off - Perfekter Start ins Projekt", Ausgabe 04/00, und in den Tipps von Gero Lomnitz "Das Projektteam erfolgreich auf die Schiene bringen: Tipps zur Vorbereitung eines Kick-off", Ausgabe 08/04, und "Das Projektteam erfolgreich auf die Schiene bringen: Tipps zur Durchführung eines Kick-off", Ausgabe 09/04.

Persönliches Exemplar für Dr. Ingrid Giel, ingrid.giel@fhnw.ch. Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

© 2005 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

Überwachung mit dem Staffellauf-Prinzip

Leerlaufzeiten vermeiden

Bei länger dauernden Projekten legt man meist feste Rückmeldezeitpunkte fest. Z.B. müssen alle Projektbeteiligten ihre Arbeitsaufwände und die Projektverantwortlichen die Statusinformationen monatlich an den Projektleiter melden. Dies setzt voraus, dass eine vollständige Ablaufplanung vorliegt, auf die sich die Rückmeldungen beziehen können.

Da Sie die Planung aber erst während des Projektablaufs durchführen, erfolgt die Rückmeldung in unserem Fall nicht datums- sondern ereignisgesteuert: Sie benötigen bei jeder Statusänderung eines Arbeitspakets sofort eine Rückmeldung. Dies drückt die erste Spielregel für die Projektdurchführung aus:

Spielregel 1:
Die Arbeitspaketverantwortlichen melden Beginn, Abschluss und Unterbrechungen von Arbeitspaketen sofort an den Projektleiter.

Das alleine genügt jedoch nicht, da Sie vermutlich über kein Projektsekretariat verfügen, das als Informationsdrehscheibe für alle Beteiligten wirken kann. Auch ist es bei der hier beschriebenen Planungsmethode nicht möglich, künftige Arbeitspakete verbindlich zu terminieren. Die Verantwortlichen können somit die benötigte Arbeitskapazität nicht im Vorhinein fest einplanen.

Damit der Projektablauf trotzdem "Hand in Hand" funktioniert, wenden Sie das Staffellauf-Prinzip aus der Planungsmethode "Critical-Chain" an. So wie beim Staffellauf der nächste Läufer startet, sobald ihm sein Teamkamerad die Staffel übergeben hat, so sollen auch die Arbeitspaketverantwortlichen ihr jeweiliges Ergebnis an den nächsten weitergeben. Daraus folgt die zweite Spielregel:

Spielregel 2:
Der Verantwortliche des nachfolgenden Arbeitspakets wird informiert, sobald der Endtermin des eigenen Arbeitspakets sicher ist. Sobald das Arbeitspaket tatsächlich abgeschlossen ist wird das Arbeitsergebnis aktiv an den nächsten Arbeitspaketverantwortlichen übergeben.

Die Vorabmeldung dient dazu, dass der betreffende Kollege sich auf seinen Arbeitseinsatz vorbereiten kann. Wichtig ist, dass die Übergabe von Projektergebnissen zur Bringschuld deklariert wird.

Das sehr umfangreiche Konzept der Planung nach Critical Chain finden Sie im Artikel von Silke Kanes "Critical Chain - der Ausweg aus der Planungsmisere?", Ausgabe 21/00.

Aufwandserfassung: Gewünscht oder verteufelt?

Eine besonders sensible Frage ist, ob der Arbeitsaufwand für dieses Projekt erfasst werden soll. Aus Sicht des Projektmanagements ist die Aufwandserfassung unverzichtbar, denn nur so kann im Nachhinein der Gesamtaufwand für das Projektergebnis bestimmt werden. Es gibt jedoch auch häufig Bedenken gegenüber einer Erfassung der Arbeitsaufwände, z.B. wenn die Projektmitarbeiter eine Leistungsbewertung befürchten oder die Linienvorgesetzten einen Eingriff in ihre Befugnisse sehen. Auch ist der Auftraggeber nicht immer daran interessiert zu wissen, welchen Aufwand das von ihm beauftragte Projekt tatsächlich verursacht. Diese Bedenken werden allerdings selten offen angesprochen, stattdessen wird die Ablehnung der Aufwandserfassung in der Regel damit begründet, dass sie zu aufwändig sei (was objektiv gesehen allerdings nicht richtig ist).

Wenn Sie auf Widerstand gegen die Erfassung des Arbeitsaufwands stoßen und der Auftraggeber ihn nicht explizit gefordert hat, dann verzichten Sie darauf. In diesem Fall verwenden Sie für die Angaben zum Arbeitsaufwand in den einzelnen Arbeitspaketen plausible Schätzwerte.

Falls die projektbezogene Aufwandserfassung jedoch vom Auftraggeber eindeutig gefordert oder in Ihrem Unternehmen ohnehin selbstverständlich ist, dann gilt die dritte Spielregel:

Spielregel 3:
Die Arbeitspaketverantwortlichen erfassen den Arbeitsaufwand für ihr Arbeitspaket und melden diesen an die Projektleitung, sobald das Arbeitspaket abgeschlossen ist.

Persönliches Exemplar für Dr. Ingrid Giel, ingrid.giel@fhnw.ch. Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

© 2005 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

Eine Hilfestellung bei einer bereits wesentlich detaillierteren Aufwandserfassung als hier vorgeschlagen gibt Ihnen der Artikel von Olaf Clausen "Kleine Projekte. Teil 2: Effiziente Erhebung wichtiger Daten während der Projektdurchführung", Ausgabe 02/01.

Projektüberwachung

Falls Sie es beim Anlegen der Arbeitspakettabelle im Tabellenkalkulationsprogramm nicht ohnehin schon gemacht haben, ergänzen Sie diese jetzt um die Spalten "Anfangstermin" und "Endtermin". Ich empfehle, mindestens die Arbeitspakettabelle und das Plakat mit dem Ablaufschema immer aktuell zu halten. Für eine Projektdokumentation oder wenn Sie das Ablaufschema neu erstellen wollen, empfiehlt es sich, auch das Textdokument mit den Arbeitspaketen zu pflegen.

Rückmeldung: Arbeitspaket abgeschlossen

- Tragen Sie den tatsächlichen Endtermin ein und markieren Sie das Arbeitspaket als "beendet."
- Falls der Arbeitsaufwand erfasst wird, tragen Sie den tatsächlichen Aufwand ein, ansonsten einen plausiblen Schätzwert.
- Überprüfen Sie, welche Arbeitspakete nun beginnen können und fragen Sie bei den betreffenden Verantwortlichen nach.

Rückmeldung: Arbeitspaket beginnt

- Tragen Sie den tatsächlichen Anfangstermin ein und markieren Sie das Arbeitspaket als "in Bearbeitung".
- Addieren Sie die veranschlagte Dauer des Arbeitspakets zum Anfangstermin und tragen Sie den so ermittelten Sollwert für den Endtermin ein.
- Tragen Sie sich in Ihren persönlichen Terminplaner eine Erinnerung für das Datum ein, bei dem die Hälfte der Arbeitspaketdauer verstrichen ist.

Laufende Überwachung

- Fragen Sie zu den Erinnerungsterminen beim jeweiligen Arbeitspaketverantwortlichen nach, ob seine Arbeiten wie geplant vorankommen.

Die laufenden Sonderaufgaben der Überwachung und Steuerung "Projektmarketing", "Änderungsmanagement" und "Trouble-Shooting" behandelt der letzte Teil dieser Artikelserie.

Rollende Planung

Planung und Umsetzung wechseln sich ab

Sie haben das Projekt "auf die Schiene gesetzt". Theoretisch sollte es jetzt selbstständig wie ein Uhrwerk ablaufen: Jeder weiß, was er zu tun hat und das Staffellauf-Prinzip sollte dafür sorgen, dass das Projekt erst nach Abschluss aller Arbeitspakete zum Stillstand kommt. Praktisch wird die Projektarbeit aber beständig zu neuen Erkenntnissen führen, die eine Änderung der ursprünglichen Planung erfordern. Außerdem müssen Sie dem Auftraggeber über den Fortschritt der Arbeiten Bericht erstatten und ihm eine immer genauere Aussage über das Projektende geben.

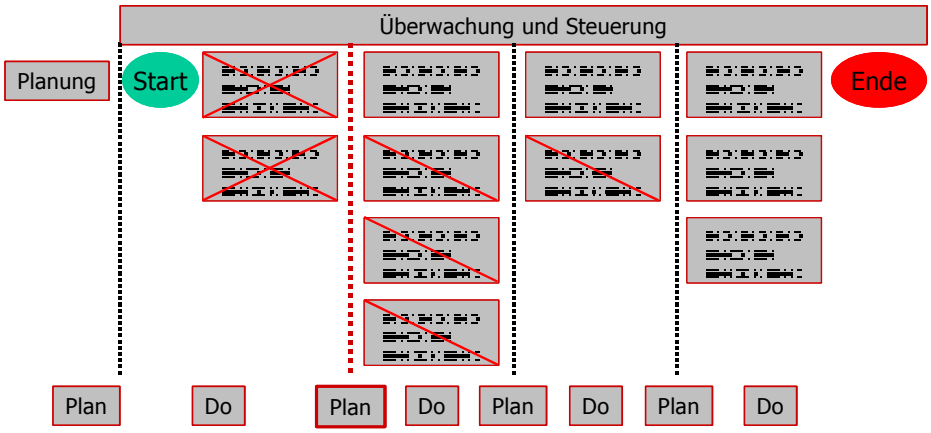

Bild 2: Ablaufschema der Rollenden Planung mit "Plan-Do".

Persönliches Exemplar für Dr. Ingrid Giel, ingrid.giel@fhnw.ch. Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

© 2005 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

Für die Projektsteuerung kombinieren wir den oben beschriebenen Plan-Do-Zyklus mit der rollenden Planung: Die Spalten im Ablaufschema repräsentieren die "Do"-Schritte, Zwischenräume die "Plan"-Schritte (Bild 2). Jede Rückmeldung über ein begonnenes oder abgeschlossenes Arbeitspaket tragen Sie nicht nur in der Planungstabelle ein, sondern auch im Ablaufschema. Ein begonnenes Arbeitspaket wird üblicherweise mit einem einfachen diagonalen Strich, ein abgeschlossenes mit zwei diagonalen Strichen gekennzeichnet.

Sobald alle Arbeitspakete einer Spalte abgeschlossen sind, führen Sie den nächsten Planungsschritt aus. Solange noch nicht alle Arbeitspakete abgeschlossen sind, ist ein weiterer Planungsschritt nicht sinnvoll möglich. Falls es an einem einzigen Arbeitspaket hängt, kümmern Sie sich ausschließlich um dieses "Sorgenkind", das unter Umständen das gesamte Projekt zum Erliegen bringen kann.

Verzicht auf einen Soll-Ist-Vergleich

Für die Planungsschritte treffen wir eine radikale Vereinfachung gegenüber den vollständigen Projektmanagementmethoden:

8. Vereinfachung: Ist-, Soll- und Plan-Daten werden nicht unterschieden, sondern gleichgesetzt.

Das ist die tiefgreifendste Vereinfachung des gesamten Schnelleinstiegs, da sie nicht mehr den Blick zurück und die Bewertung des aktuellen Status ermöglicht. Ähnlich wie der Verzicht auf die Prozessschritte "Check" und "Act" bedeutet diese Vereinfachung, dass Ursachenforschung und Sicherung von Erfahrungswerten nicht mehr möglich sind.

Deshalb verzichten wir im Schnelleinstieg auf die traditionellen Überwachungsmöglichkeiten wie den Soll-Ist-Vergleich, die Earned Value-Analyse, die Meilensteintrendanalyse oder die Kostentrendanalyse. Diese würden Ihnen bei Ihrem ersten Projekt wenig helfen. Erst mit zunehmender Projekterfahrung werden Sie die eine oder andere Methode als nützlich erkennen und in Ihr Repertoire aufnehmen.

Eine kleine Hintertür sollten Sie sich dennoch offen halten: Speichern Sie vor jedem Planungsschritt die Datei mit der Planungstabelle in einem Archivverzeichnis unter einem anderen Dateinamen ab. In diesen sogenannten Basisplänen können Sie bei Bedarf nachschauen, wie die vorherige Planung war.

Die nächste Phase planen

Die eigentliche Planungsmethode ist sehr einfach und schematisch durchzuführen. Sobald alle Arbeitspakete einer Spalte abgeschlossen sind, führen Sie folgende Schritte durch:

- Berechnen Sie die tatsächliche Dauer aller abgeschlossenen Arbeitspakete in Arbeitstagen und tragen Sie diese ein.
- Überprüfen Sie, ob alle Arbeitspakete der nächsten Spalte begonnen sind. Fragen Sie bei den Verantwortlichen nicht begonnener Arbeitspakete nach.
- Übertragen Sie das geplante Enddatum aller begonnenen Arbeitspakete in die geplanten Anfangstermine der von ihnen abhängigen Arbeitspakete in der übernächsten Spalte. Wenn ein Arbeitspaket von mehr als einem Vorgänger abhängt, verwenden Sie den spätesten Endtermin als Anfangstermin.
- Berechnen Sie die Schätzwerte für die Restdauer des Projekts nach der im ersten Teil beschriebenen Rechenmethode und bestimmen Sie den voraussichtlich spätesten Endtermin.

Setzen Sie anschließend die betroffenen Arbeitspaketverantwortlichen über jeweils aktualisierte Anfangstermine in Kenntnis und teilen Sie allen Projektbeteiligten die neuen Eckdaten (Schätzwerte für Projektende und Projektbudget) mit.

Projektsteuerung mit Aufgabenlisten

Der Projektstrukturplan und die Arbeitspakete sind für das Projektgebäude wie der Rohbau für das Haus: Stabil aber nicht bewohnbar. Aus reiner Projektmanagementsicht könnte man es dabei belassen. Aber für diejenigen, die das Projekt mit Leben erfüllen sollen, sind Projektstrukturplan, Arbeitspakete und Ablaufschema nicht ausreichend. Sie benötigen für die tägliche Projektarbeit weitere Werkzeuge, um die Arbeitspakete

Persönliches Exemplar für Dr. Ingrid Giel, ingrid.giel@fhnw.ch. Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

© 2005 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

effizient erledigen zu können. Als bewährtes und unmittelbar verständliches Werkzeug für die operative Projektabwicklung empfehle ich den Einsatz von Aufgabenlisten für alle Arbeitspaketverantwortlichkeiten.

Die Aufgabenliste (To-Do-Liste) ist meiner Meinung nach das mächtigste Instrument im Projektmanagement – vorausgesetzt, sie wird vollständig und diszipliniert geführt. In einfachen Fällen reicht eine Aufgabenliste sogar für das gesamte Projektmanagement aus. Wir verwenden Sie, um den Arbeitspaketverantwortlichen eine einheitliche Methode zur Leitung der Arbeitspakete an die Hand zu geben. Darüber hinaus liefert sie eine Minimalversion für das Informations- und Berichtswesen.

Spielregel 4:
Die operative Projektarbeit wird mit Hilfe von Aufgabenlisten gesteuert, in denen die erzielten Ergebnisse dokumentiert werden.

Eine Aufgabenliste besteht in der einfachsten Version aus folgenden Spalten:

- Nummer der Aufgabe (Nr.)
- Nummer des Arbeitspakets, zu dem die Aufgabe gehört (AP-Nr.)
- Kurze Aufgabenbeschreibung (Aufgabe)
- Zuständige Person (verantw.)
- Endtermin (Termin)
- Status (nicht begonnen, in Bearbeitung, erledigt) (Status)
- Beschreibung des Ergebnisses (sobald das Arbeitspaket "erledigt" ist)

Die Aufgabenliste ist eine Vereinfachung des sogenannten "Issue Management". "Issue" bedeutet dabei nicht nur "Aufgabe", Issues können auch Fragen, Risiken oder Änderungsanforderungen sein. Da wir über keine Prozesse verfügen, um letztere zu bearbeiten, müssen wir alle Punkte als Aufgaben formulieren.

9. Vereinfachung: Alle offenen Punkte (Project Issues) werden als Aufgaben formuliert.

Die Frage "Welche Farbe soll das Gehäuse haben?" kann z.B. als Aufgabe "Entscheidung über Gehäusefarbe treffen" formuliert werden. Schwieriger sind Änderungsanforderungen, die im letzten Teil der Artikelserie behandelt werden. Eine Änderungsanforderung umfasst nämlich in der Regel mehrere Aufgaben, wie z.B. "Auswirkungen auf das Projekt beurteilen" oder "Die Entscheidung des Auftraggebers einholen".

Wie Sie konkret mit den Aufgabenlisten arbeiten wollen, müssen Sie selbst entscheiden. Es ist z.B. möglich, dass die Aufgabenlisten nur innerhalb eines Arbeitspakets geführt werden. Es kann aber auch sein, dass eine einzige, gemeinsam geführte Aufgabenliste für das ganze Projekt die richtige Lösung ist. Der optimale Einsatz hängt von der Zahl der Projektbeteiligten, der Komplexität des Projekts, den Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen und der Führungskompetenz der Arbeitspaketverantwortlichen ab.

Nr.	**AP-Nr.**	**Aufgabe**	**verantw.**	**Termin**	**Status**
...	...	...	...	...	...
5	2	passenden Akku auswählen	Müller	12.12.2005	in Bearbeitung
6	4	Stabilitätstest	Huber	20.12.2005	nicht begonnen
...	...	...	...	...	...
Erledigte Aufgaben					
Nr.	AP-Nr.	Aufgabe	verantw.	erl. am	Ergebnis
1	2	Gehäusefarbe festlegen	Meier	14.11.2005	lichtgrau

Tabelle 1: Beispiel für eine Aufgabenliste mit anstehenden und erledigten Aufgaben.

Persönliches Exemplar für Dr. Ingrid Giel, ingrid.giel@fhnw.ch. Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

© 2005 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion

Allgemein gelten folgende Regeln für das Arbeiten mit Aufgabenlisten in Projekten:

Spielregel 5:
Nur Aufgaben, die einem Arbeitspaket zugeordnet werden können, gehören zum Projekt.

Damit vermeiden Sie, dass Ihr Projekt als "Mülleimer" für alle ungeliebten und arbeitsintensiven Aufgaben benutzt wird.

Spielregel 6:
Wenn ein Arbeitspaket abgeschlossen ist, wird die Arbeitspaketliste an die Verantwortlichen der nachfolgenden Arbeitspakete und den Projektleiter übergeben.

Je nach persönlichen Vorlieben und vorhandener IT-Unterstützung können Sie die Aufgabenlisten mit einem Dokument in der Textverarbeitung einer Tabelle im Kalkulationsprogramm, im elektronischen Terminkalender oder in einem Projektportal führen. Verwenden Sie aber nichts, was nicht schon vorhanden ist! Die Einführung einer neuen Software kostet jetzt zuviel Zeit und Sie haben kein ausreichendes Wissen über den tatsächlichen Bedarf.

Über die professionelle Variante der Aufgabenliste, das so genannte "Issue Tracking" erfahren Sie mehr im Artikel von Gerhard Großberger "Issue Tracking im Projektmanagement. Teil 1: Vorteile und Anwendungsbereiche", Ausgabe 09/05.

Mehr zu diesem Thema in den Rubriken Software und Dienstleister

Planungs-Software

Aus- und Fortbildung

Ausnahmen bestätigen die Regeln

Grundsätzlich haben Sie nun alles in der Hand, um Ihr erstes Projekt erfolgreich durchzuführen. Der graue Projektalltag wird Sie jedoch vermutlich mit einer Reihe von Problemen konfrontieren, wie z.B.:

- Immer neue Änderungsanforderungen verzögern das Projekt beständig in kleinen Schritten.
- Der Auftraggeber will endlich Ergebnisse sehen.
- Ressourcen stehen nicht wie geplant zur Verfügung
- Zwischenergebnisse kommen nicht pünktlich oder gar nicht zustande.
- Andere unvorhergesehene Probleme tauchen auf.

Es ist genauso schwierig ein Projekt zum Abschluss zu bringen, wie ein Projekt in Gang zu setzen. Der letzte Teil der Serie widmet sich deshalb den Überwachungs- und Steuerungsmethoden, um ein Projekt erfolgreich zu beenden. Hauptpunkte sind dabei das Projektmarketing, um die Abnahme des Ergebnisses durch den Auftraggeber zu erreichen, das Änderungsmanagement, um Verzögerungen abzuwehren und um das Trouble-Shooting für Problemfälle.

Persönliches Exemplar für Dr. Ingrid Giel, ingrid.giel@fhnw.ch. Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet.

© 2005 Projekt Magazin. Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit schriftl. Genehmigung der Redaktion
